

Agenda

- Projektin tavoitteet
- Projektin organisointi ja resurssit
- Seuranta ja raportointi
- Viestintä
- Riskit
- Aikataulu ja vastuut

Riski	Kuvaus	Vakavuus (1-5)	Todennäköisyys %	Seuraus	Toiminta
Ei saada viestiä oikeille päättäjille	Päätäjät eivät tiedä faktoja tai vaikutetaan väärin ihmisiin	5	60%	KY:lle epäedulliset päätökset; vaikuttamiseen käytettyjen resurssien hukkaaminen	Kysytään kaikilta kenen pitää vaikuttaa missäkin asiassa ja viedään viestiä kaikilla keinoin (Taivaan apuna)
Ei neuvotteluynleityä	Keskustelua ei käydä TKY:n ja TOKYO:n kanssa oikeista asioista	3	70%	Uusi yo-kunta aloittaa tyhjistä; jäsenjärjestö riidoissa; ei toivoa yhteisistä vaikuttamistyöstä	Ollaan itse aktiivisissa keskustelun avaajia; tullaan vastaan mikä suinkin voidaan
Resurssit eivät riitä	Aika loppuu kesken tulokisista syistä	5	40%	Asiat etenevät ilman KY:n vaikutusta	Huolellinen koordinaatio ja vastuun kanto; osallistetaan useampia kun mahdollista
Edustajisto ei ole haluttua päätöstä	Prosessi jumittuu edustajistoon	5	30%	Mitään ei lopulta tapahdu ilman tulokisilisten vaikutusta; kaikki työ tehty turhaan	Viedään viestiä edustajiston kautta ja avoin viestintä tehdään mahdollisimman huolellisesti
Mediakuva epäedullinen KY:lle	KY viestii huonosti mediaan päin	4	30%	Julkinen kuva KY:stä roistona; ei sympatioita omille tavoitteille; muut sanelevat miten edetään	Hoidetaan huolellisesti ja suunnitellusti mediasuhheet Taivaan kanssa
Huono sisäinen viestintä (toimisto)	Epäiltoisuutta tulevasta ja pinnennossa oleminen tunne toimistolla	3	30%	Kyräily; huono ilmapiiri KY:llä; yhteistyövaikeudet; vakkant lähtevät talosta	Suunnitellaan ja aikatauletaan kaikille viestintä
Huonosti tehdyt kotikäysyt	Ei oteta huolellisesti selvää kaikista	4	10%	Päätöksiä tehdään (untemalla) kaikkia faktoja tehdään ohka väärin päätöksiä	Pidetään kirjaa kaikista mitä pitää selvittää ja so. tehdään toisissaan (DoK apuna)
Ei tulkita kaikkia vaihtoehtoja	Vaihtoehtojen määrä todellista pienempi	4	10%	Tarvitaan vääriä vaihtoehtoja kun olisi parempiakin	Kysytään kaikilta mahdollisilla muilla vaihtoehtoista kunkin tapauksen sutiiteen (esim. säätiön perustaja)
Ohittava	Jäsenet eivät tiedä missä	4	10%	Etijuttamusta KY:n	Huolellinen seuranta




Agenda

- Projektin tavoitteet
- Projektin organisointi ja resurssit
- Seuranta ja raportointi
- Viestintä
- Riskit
- Aikataulu ja vastuut


Aikataulu

- Säätiö pystyssä 09/08 (maaliskuusta)
- Varojen siirto 09/08 tai 10/08
- Säätiön toiminnan käynnistys 10/08
- Yhdistys pystyssä 05/08 (helmikuusta)
- Jäsenrekrytointi 10/08 (toukokuusta)
- Yhdistyksen toiminnan käynnistys 08/08
- Uuden yo-kunnan suunnitelmat 12/08 (helmikuusta)
- Vanhan KY:n alasajo 09/09 (elokuusta -08)

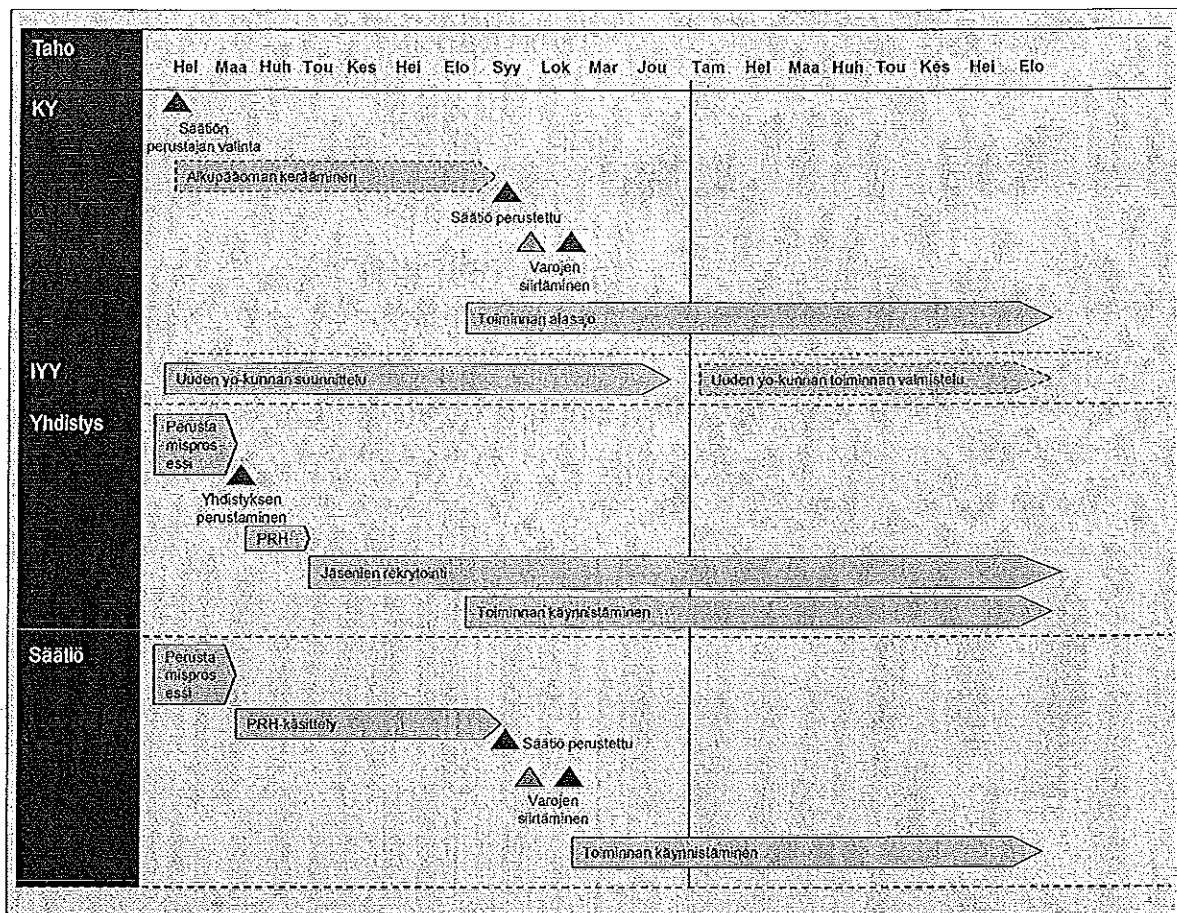

Vastuut

- TTR:n henkilöille jaettu
 - Vähentää koko porukan meilisotaa ja kokoontumisen tarvetta
- Yksi henkilö pitää langat käsissä ja hoitaa hommat kullakin vastuualueella
- Ottaa tarvittavat apuvoimat muualta
 - Osallistaminen
 - Lisäpalkkaukset

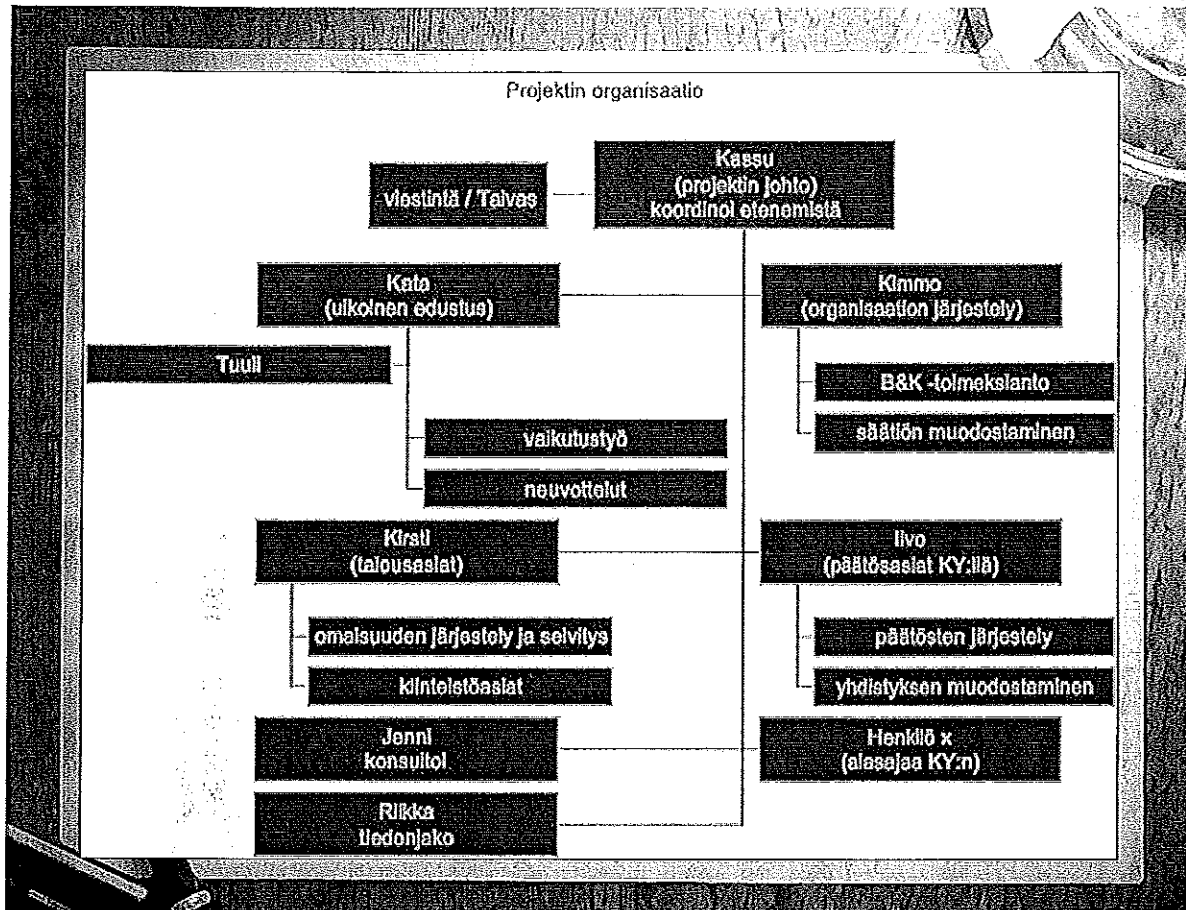

Mitä nyt


- Viikon sisällä tiedossa kaikki tarvittava säätiöön liittyen
 - Kuka perustaa
 - Mistä pääoma
 - Säännöt lausuntokierrokselle
- Hiotaan kuntoon, perustaminen huhtikuussa jos ei ihmeitä tapahdu

Mitä nyt

- Yhdistys perustetaan joka tapauksessa maaliskuussa
 - Yksityishenkilöt perustavat
 - Säännöt lausuntokierrokselle
- Osakunta enenevässä määrin mahdollinen
 - Voi olla molemmat!

Mitä nyt

- Sanotaan joko pahasti tai hyvästi teekkareille
 - Alkaa näyttämään huonolta jo ulospäin että riitaa on edelleen
- Selusta alkaa olla turvattu
 - Yksityiskohdissa ja vaikuttamisessa valtavasti työtä vielä
- Suunnitelman uudelleenarviointi



Päätöksen muotoilua

Edustajiston työryhmä



Sovintoesityksestä

- Käsitteeseen vai ei käsitteeseen KYE 30.10
 - Parempi ainakin käsitellä, koska silloin otetaan kantaa esitykseen
 - Ongelma, että ei varsinaista yhteistä esitystä (ei allekirjoitettu, joten "KY:n muotoilu" menee käsitteeseen)
 - "Neuvotteluryhmän pohdintojen pohjalta muodostettu sovinto", jonka KY (ja TOKYO) voi hyväksyä
 - Oleellista saada neuvottelut kuitenkin käyntiin > voi estää valitusta (ei varmaa kuitenkaan)



Pohdintaa

- Mitä haittaa on jos siirretään samalla 30.10. myös etuoikeusasemassa olevat kiinteistöt?
 - Silloin varmaa, että sovintoa ei ole saatavilla
- Entä jos ehdollisena?
 - Silloin suullisestikin saatu luottamus mennyttä
- Jos sovinnon mukaan, mutta valitus tulee?
 - Teekkarit eivät silloin teknisesti rikkoneet sovintoa
- Entä jos hyväksytään ensimmäisenä sovintopaperi?
 - Tarkalleen ottaen ei sovintoa, epävirallinen yhteisymmärrys
 - Voi johtaa siihen, että etuoikeuksia ei tule

1.1.2007

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPIPILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS

KY



Pohdintaa

- Ensin ehkä tulisi saada turvaan mitä on saatavilla
 - Jos valitus tulee, liipaistaan "loputkin" / valtaosa säätiöön
 - Juridijikka selvitetään joka tapauksessa, "upperikasvai rutiköyhä"
 - Jos ei tule, voidaan tehdä mitä huvittaa
 - Neuvotteluvallti!
 - Kasvaako nälkä syödessä..?
- **NÄISTÄ SAMAA MIELTÄ JO**

1.1.2007

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPIPILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS

KY



Pohdintaa

- Sovintoesitys ehkä pitäisi hyväksyä;
 - Voidaan vedota teekkareihin että jos eivät hyväksy niin "varmistetaan vain kämppien osalta" ja säätiöidään sitten ne
 - Jää vielä mahdollisuus että voidaan säätiöidä muutakin (aikataulullisesti mahdollista kuitenkin tehdä ensin varmat, sitten 4 asuntolaa, ja vasta sen jälkeen potentiaalisesti ahnehtia)

1.1.2007

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS

TKY



Mitä siis tehdään

- Sovintoesitys esitetään hyväksyttäväksi
- Säätiöidään mitä saadaan esityksen mukaan
- TKY hyväksyy 23.10. > TOKYO 27.10. (wild card) > ok
 - Jos TOKYO ei hyväksy > ei sovintoa
- TKY ei hyväksy 23.10. > TOKYO 27.10. (wild card) > KY hyväksyy, mutta TKY:lle 6.12. dedis "tai menee etuoikeusasunnot säätiöön"
 - Jos TOKYO ei hyväksy > uusi mahdollisuus /ei sovintoa
- Jos TKY hyväksyy, lähtökohtaisesti ei säätiöidä asuntoja
- Jos TKY ei hyväksy, voidaan säätiöidä jos ei muuten voi varmistaa etuoikeusasumisia

1.1.2007

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS

TKY



Päätösesitykset 30.10.

- **PE: Hyväksytään sovintoesitys (sisällöltään)**
 - Esityksessä sellaisenaan
 - Jos TKYE ei hyväksy, tehdään uusi esitys uudella päivämäärällä (pohja-esitystä vastaan)
 - "Sovintoesityksen mukaan KY:n koko asuntokanta sekä rahasto-osuuksia 4,5 m euron arvosta siirtyy yleisseuraantona Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle"
- **PE: säätiöidään**
 - KY-talo
 - A28
 - Rahasto-osuuksia n. 26m euron arvosta

1.1.2007

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPIPIJASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS

KY



Selvitys KY:n tulevaisuushankkeesta

Edustajiston tapaaminen

17.5.2010

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS

KY



Agenda

1. KY:n linja Aalto-yliopistosta
2. KY:n tavoitteet ylioppilaskunnan suhteen
3. Juridiset näkökohdat/tehdyt selvitykset
4. Kahden organisaation malli (yhdistys+säätiö)
5. Neuvottelut
6. Vaikutustyö ja media
7. Tilanne nyt
8. Päätökset
9. KY:n projektiorganisaatio
10. Päätösaikataulu ja mahdollisen oikeusprosessin aikataulu

1.3.2007

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS

KY



KY:n linja Aalto-yliopistosta

- KY on alusta lähtien suhtautunut hankkeeseen varovaisen positiivisesti
- Vuodesta 2006 lähtien hanketta on avoimesti kannatettu
- KY näkee Aalto-yliopistossa monia mahdollisuuksia opiskelijoille
 - Arvostetumpi yliopisto – arvokkaampi tutkinto
 - Enemmän mahdollisuuksia
 - Parempaa opetusta ja opetuksen tukipalveluita

1.1.2007

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPIILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS

KY



Agenda

1. KY:n linja Aalto-yliopistosta
2. KY:n tavoitteet ylioppilaskunnan suhteen
3. Juridiset näkökohdat/tehdyt selvitykset
4. Kahden organisaation malli (yhdistys+säätiö)
5. Neuvottelut
6. Vaikutustyö ja media
7. Tilanne nyt
8. Päätökset
9. KY:n projektiorganisaatio
10. Päätösaikataulu ja mahdollisen oikeusprosessin aikataulu

1.3.2007

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPIILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS

KY
